

УТВЕРЖДАЮ

Глава

Колокольцовского муниципального образования Калининского
муниципального района Саратовской области



Бригадиренко О.В.

(Ф.И.О.)

Отчет

администрации об итогах реализации инициативного проекта с использованием средств областного бюджета.

по состоянию на 18 ноября 20 21 года
(число, месяц)

Наименование инициативного проекта
(далее- Проект)

"Благоустройство парка"

Наименование муниципального
образования области

Колокольцовское муниципальное образование Калининского муниципального
района Саратовской области

Реквизиты соглашения о предоставлении
из областного бюджета Субсидии

Дата 9 июня 20 21 г. Номер 06-01-10/5- 052
(число, месяц)

Сформирован на основании

ст. 26.1, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Информация о расходах на реализацию Проекта и соблюдении установленного уровня софинансирования объема расходных обязательств муниципального образования

№ п/п	Показатель	Код направления расходов, содержащийся в коде целевой статьи расходов <1>	Предусмотрено соглашением <2>		Кассовые расходы		Остаток средств (гр. 4 - гр. 6)	Примечание <4>
			рублей	уровень софинансирования в процентах	рублей	в процентах к расходам всего <3>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Расходы - всего, в том числе за счет средств:		1 673 303,00	100	1 673 303,00	100,0	0,00	
2.	Субсидии	7210 1	1 000 000,00	59,7	1 000 000,00	59,7	0,00	
3.	Бюджета муниципального образования, из них:		170 000,00	10,2	170 000,00	10,2	0,00	
3.1	по Соглашению	S211 1	170 000,00	10,2	170 000,00	10,2	0,00	
3.2	сверх предусмотренных Соглашением <5>		X	X	0,00	0,0	X	
4.	Инициативных платежей граждан, из них		55 000,00	3,3	55 000,00	3,3	0,00	
4.1	по Соглашению	S212 1	55 000,00	3,3	55 000,00	3,3	0,00	
4.2	сверх предусмотренных Соглашением <5>		X	X	0,00	0,0	X	
5.	Инициативных платежей индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, их них		448 303,00	26,8	448 303,00	26,8	0,00	
5.1	по Соглашению	S213 1	448 303,00	26,8	448 303,00	26,8	0,00	
5.2	сверх предусмотренных Соглашением <5>		X	X	0,00	0,0	X	

Таблица 2

Информация о достижении значений результатов использования Субсидии и об объеме обязательств, принятых в целях их достижения

№ п/п	Закупка товаров, работ, услуг в целях достижения результата использования субсидии					Объем обязательств, принятых в целях достижения результата использования Субсидии												Фактическая оплата	Примечание
	Объект закупки					бюджетные обязательства (обязательства <6>)				сумма	Эквивалент (гр. 6 – гр.11)	денежные обязательства							
						сведения о заключенном контракте (договоре)						сведения о фактическом исполнении заключенного контракта (договора)							
																наименование исполнителя	номер		
наименование	краткое описание	Код способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) <7>	Дата начала осуществления закупки <8>	Начальная (максимальная) цена контракта <8>															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
I. Объем финансового обеспечения расходных обязательств, предусмотренный Соглашением																1 673 303,00			
II. Исполнение расходных обязательств в разрезе видов закупок товаров, работ и услуг:																			
1	Выполнение работ по благоустройству парка села Колокольцовка Калининского района Саратовской области, в соответствии с техническим заданием и локально-сметным расчетом	Ремонт покрытия пешеходных дорожек: устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, установка бортовых камней; Благоустройство территории: 1. установка скамеек и урн (установка столбов с погружением в бетонное основание); 2.Монтаж уличного освещения (разработка грунта вручную в траншеях без крепления с откосами, засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работа на отвале, устройство основания под фундамент песчаный, установка столбов с погружением в бетонное основание, установка светильников ана здания, затягивание провода в проложенные трубы и рукава.	5			ООО"Сервис Строй ЛТД"	1	01.07.2021	31.07.2021	520 379,00		Акт о приеме выполненных работ	1	31.07.2021	520 379,00	520 379,00			
2	Выполнение работ по благоустройству парка села Колокольцовка Калининского района Саратовской области в соответствии с техническим заданием и локально-сметным расчетом	1. Подготовительные работы: разборка тротуаров из мелкоштучных искусственных материалов, разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотка отбойника, разборка оснований щебеночных, погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках (погрузка мусора строительного с погрузкой вручную), разборка бортовых камней, погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках (погрузка мусора строительного с погрузкой вручную), перевозка грузов автомобилями-самосвалами, разработка грунта вручную в траншеях без крепления с откосами, засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства, перевозка грузов автомобилями -самосвалами, работа на отвале. 2.Благоустройство территории: установка столбов с погружением в бетонное основание, устройство ограждения из готовых решетчатых панелей.	5			ООО"Сервис Строй ЛТД"	2	01.07.2021	20.07.2021	554 292,00		Акт о приеме выполненных работ	2	20.07.2021	554 292,00	554 292,00			
3	Ремонт покрытия пешеходной зоны из тротуарной плитки по адресу:Саратовская область,Калининский район,с.Колокольцовка, в соответствии с техническим заданием и локально-сметным расчетом	Ремонт покрытия пешеходной зоны из тротуарной плитки: устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; устройство прослойки из синтетического материала, устройство оснований щебня; устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (устройство выравнивающего слоя); устройство покрытия из тротуарной плитки.	5			ООО"Сервис Строй ЛТД"	3	01.09.2021	20.09.2021	598 632,00		Акт о приеме выполненных работ	21/1509/001	15.09.2021	598 632,00	598 632,00			
4																			
Итого по разделу II			X		0,00	X				1 673 303,00	0,00	X			1 673 303,00	1 673 303,00	X		
III. Непользованный объем финансового обеспечения расходных обязательств (раздел I – итого по графе 16 раздела II)																0,00			
IV. Достигнутый результат (1 – проект реализован, проект не реализован – 0)																1			

Информация о результатах поддержки, оказанной заинтересованными лицами в рамках реализации инициативного проекта

Код строки	Наименование	Предусмотрено соглашением	Реквизиты документа, подтверждающего проведение операции					Исполнено	Отклонение (гр. 3 - гр.9)	Примечание
			№ п/п	Вид документа	№	дата	Наименование заинтересованного лица			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Финансовое, имущественное и трудовое участие заинтересованных в софинансировании проекта лиц, всего (сумма строк I.1, I.2) из них	529 703,00			X			543 903,00	-14 200,00	X
I.1	Инициативные платежи граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, всего в том числе в разрезе источников финансового обеспечения и кодов бюджетной классификации предусмотренных в бюджете муниципального образования по инициативному проекту:	503 303,00			X			503 303,00	0,00	X
I.1.1	Инициативные платежи граждан, всего код по БК 284 1 17 15030 10 2 052 150 в том числе в разрезе документов	55 000,00			X			55 000,00	0,00	
		1	Платежное поручение	529437	28.07.2021	Трофимов Александр Сергеевич	55 000,00		Софинансирование инициативного проекта жителями муниципального образования.
		2							
I.1.2	Инициативные платежи индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, всего код по БК 284 1 17 15030 10 3 052 150 в том числе в разрезе документов	448 303,00			X			448 303,00	0,00	
		1	Платежное поручение	820	23.06.2021	ООО "Кольцовское"			Инициативные платежи, перечисленные в рамках софинансирования проекта, были зачислены органом федерального казначейства код "Невыясненные поступления, т.к. на момент поступления средств коды подвидов доходов бюджетов по виду доходов бюджетов 000 1 17 15000 00 0000 150 "Инициативные платежи" с применением детализированных кодов группы подвида доходов бюджетов не были включены в "Перечень кодов" бюджета муниципального образования.
		2	Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа	4	01.07.2021	ООО "Кольцовское"	448 303,00		Средства, ранее зачисленные по платежному документу на код "Невыясненные поступления", на основании письма плательщика, подтверждающего факт перечисления средств в рамках софинансирования инициативного проекта были уточнены и поступили в бюджет муниципального образования на соответствующий источник финансирования.
		3							
I.2	Участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта, всего в том числе	26 400,00			X			40 600,00	-14 200,00	В ходе реализации инициативного проекта возникла потребность привлечения дополнительных ресурсов, в результате фактическая величина денежного вклада заинтересованных лиц превысила предусмотренный условиями Соглашения объем.
I.2.1	имущественное участие, всего в том числе в разрезе документов	0,00			X			0,00	0,00	
		1							
I.2.2	трудовое участие, всего в том числе в разрезе документов	26 400,00			X			40 600,00	-14 200,00	X
		1	Акт о приеме выполненных работ(оказанных услуг)	1	01.10.2021		15 000,00		Работы выполнены жителями муниципального образования.
		2	Акт о приеме безвозмездно выполненных работ(оказанных услуг)	2	01.10.2021	ООО "Кольцовское"	25 000,00		
		3							

Таблица 4

Информация о расходах, произведенных в рамках исполнения принятых обязательств перед поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в ходе реализации инициативного проекта.

Код строки	Наименование показателя	Бюджетные ассигнования, предусмотренные в решении о местном бюджете на исполнение расходных обязательств муниципального образования в рамках софинансирования инициативного проекта		Реквизиты документа, подтверждающего проведение операции					Кассовые расходы	Неиспользованный объем финансового обеспечения расходных обязательств (гр. 4 - гр. 10)	Примечание
		Код направления расходов целевой статьи	Сумма	№ п/п	Наименование	номер	дата	Наименование получателя			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Расходы получателя субсидии, всего (сумма строк 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) в том числе за счет средств:	X	1 673 303,00	X					1 673 303,00	0,00	X
1.1.	Субсидии из областного бюджета всего в том числе в разрезе документов	7210 1	1 000 000,00	X					1 000 000,00	0,00	
	по Договору № 1 от 01.07.2021			1	Платежное поручение	307	09.07.2021	ООО"Сервис Строй ЛТД"	156 113,70		
	по Договору № 2 от 01.07.2021			2	Платежное поручение	308	09.07.2021	ООО"Сервис Строй ЛТД"	143 886,30		
	по Договору № 1 от 01.07.2021			3	Платежное поручение	532	09.11.2021	ООО"Сервис Строй ЛТД"	101 368,00		
	по Договору № 3 от 01.09.2021			4	Платежное поручение	537	12.11.2021	ООО"Сервис Строй ЛТД"	598 632,00		
	по № от			5							
	по № от			6							
1.2.	Бюджета муниципального образования, всего в том числе:	X	170 000,00	X					170 000,00	0,00	X
1.2.1	предусмотрено соглашением в том числе в разрезе документов	S211 1	170 000,00	X					170 000,00	0,00	
	по Договору № 1 от 01.07.2021			1	Платежное поручение	376	19.08.2021	ООО"Сервис Строй ЛТД"	170 000,00		
	по № от			2							
1.2.2	привлечение дополнительных средств в том числе в разрезе документов	0 0		X					0,00	0,00	
	по № от			1							
1.3.	Инициативных платежей граждан, всего в том числе:	X	55 000,00	X					55 000,00	0,00	X
1.3.1	предусмотрено соглашением в том числе в разрезе документов	S212 1	55 000,00	X					55 000,00	0,00	
	по Договору № 1 от 01.07.2021			1	Платежное поручение	377	19.08.2021	ООО"Сервис Строй ЛТД"	55 000,00		
	по № от			2							
1.3.2	привлечение дополнительных средств в том числе в разрезе документов	0 0		X					0,00	0,00	
	по № от			1							
1.4.	Инициативных платежей индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, всего в том числе:	X	448 303,00	X					448 303,00	0,00	X

Код строки	Наименование показателя	Бюджетные ассигнования, предусмотренные решением о местном бюджете на исполнение расходных обязательств муниципального образования в рамках софинансирования инициативного проекта		Реквизиты документа, подтверждающего проведение операции					Кассовые расходы	Неиспользованный объем финансового обеспечения расходных обязательств (гр. 4 - гр. 10)	Примечание
		Код направления расходной цели	Сумма	№ п/п	Наименование	номер	дата	Наименование получателя			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.1	предусмотрено соглашением в том числе в разрезе документов	5213 1	448 303,00	X					448 303,00	0,00	
	по Договору № 2 от 01.07.2021			1	Платежное поручение	309	09.07.2021	ООО "Сервис Строй ЛТД"	22 401,30		
	по Договору № 2 от 01.07.2021			2	Платежное поручение	336	05.08.2021	ООО "Сервис Строй ЛТД"	388 004,40		
	по Договору № 1 от 01.07.2021			3	Платежное поручение	378	19.08.2021	ООО "Сервис Строй ЛТД"	37 897,30		
	по № от			4							
1.4.2	привлечение дополнительных средств в том числе в разрезе документов	0 0		X					0,00	0,00	
	по № от			1							

Инициативная группа, утвержденная собранием граждан Колокольниковского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области (дата проведения собрания 17 февраля 2021 года) подтверждает:

1. Работы в рамках реализации инициативного проекта выполнены качественно, в установленные сроки и соответствуют утвержденной проектно-сметной документации;
 2. Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта произведено превышает предусмотренный условиями заключенного Соглашения объем ;
 3. Предусмотренные, в рамках софинансирования проекта, инициативные платежи поступили в бюджет муниципального образования, и использованы по целевому назначению;
 4. Принятые муниципальным образованием обязательства перед подрядчиком исполнены полностью;
- Утвержденные решением о бюджете муниципального образования бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходных обязательств в рамках инициативного проекта освоены в полном объеме по всем предусмотренным источникам софинансирования.

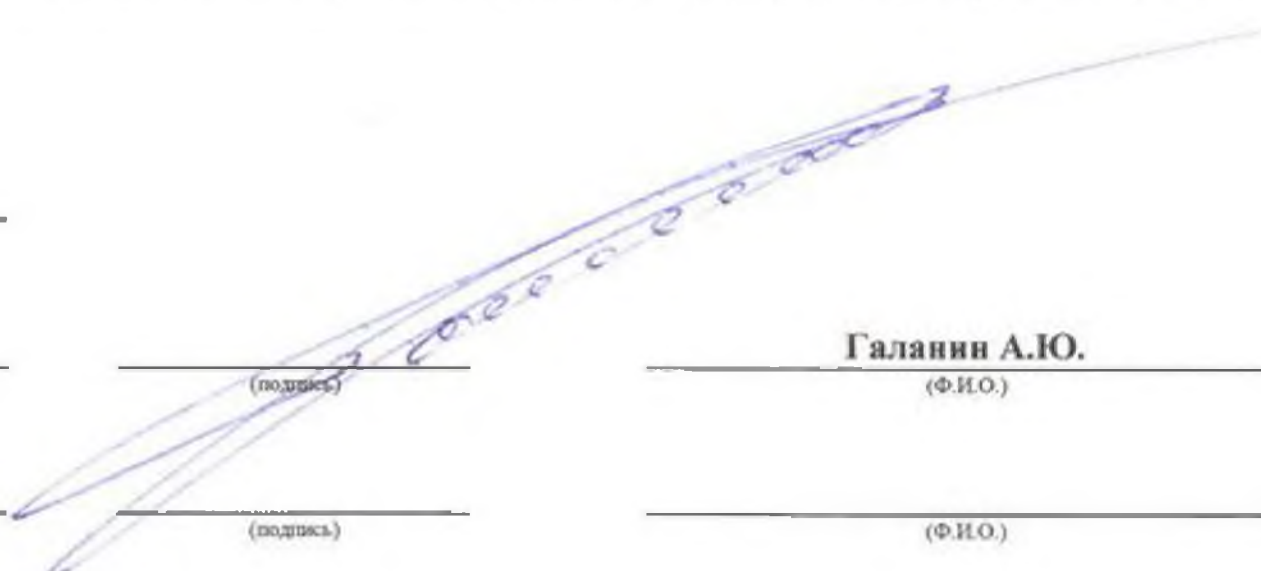
Проект реализован в полном объеме.

Руководитель

 Трофимов А.С.
(подпись) (Ф.И.О.)

Члены

 Галанина Л.А.
(подпись) (Ф.И.О.)

 Галанин А.Ю.
(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

К отчету прилагаются скан-образы документов подтверждающих:

1. фактическое выполнение работ, в рамках реализации проекта в полном объеме;
2. поступление в бюджет муниципального образования инициативных платежей предусмотренном объеме;
3. фактическое перечисление муниципальным образованием средств за выполненные работы в рамках реализации инициативного проекта по каждому из источников финансирования в предусмотренных объемах;
4. фактическое трудовое участие заинтересованных в софинансировании проекта лиц;
5. фотографии, свидетельствующие о реализации инициативного проекта.
